


実施工程表

(2022/8月度見直版)

製番: 1S000001 (01-06266-00 旧)

発注者	備前市 殿
工事名	坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ場整備事業
工事場所	備前市坂根331-1(坂根浄水場内)/備前市東片上地内(三石第一加圧ポンプ場)
工期	2020年3月26日~2024年4月30日(第2回変更)

作成年月日	2024年2月26日
受注者	コンソーシアム構成会社: クボタ・備前・東備建設・NJS・ クボタ建設・東芝インフラシステムズ
作成者	寺島 公彦 (☎080-2447-9361)

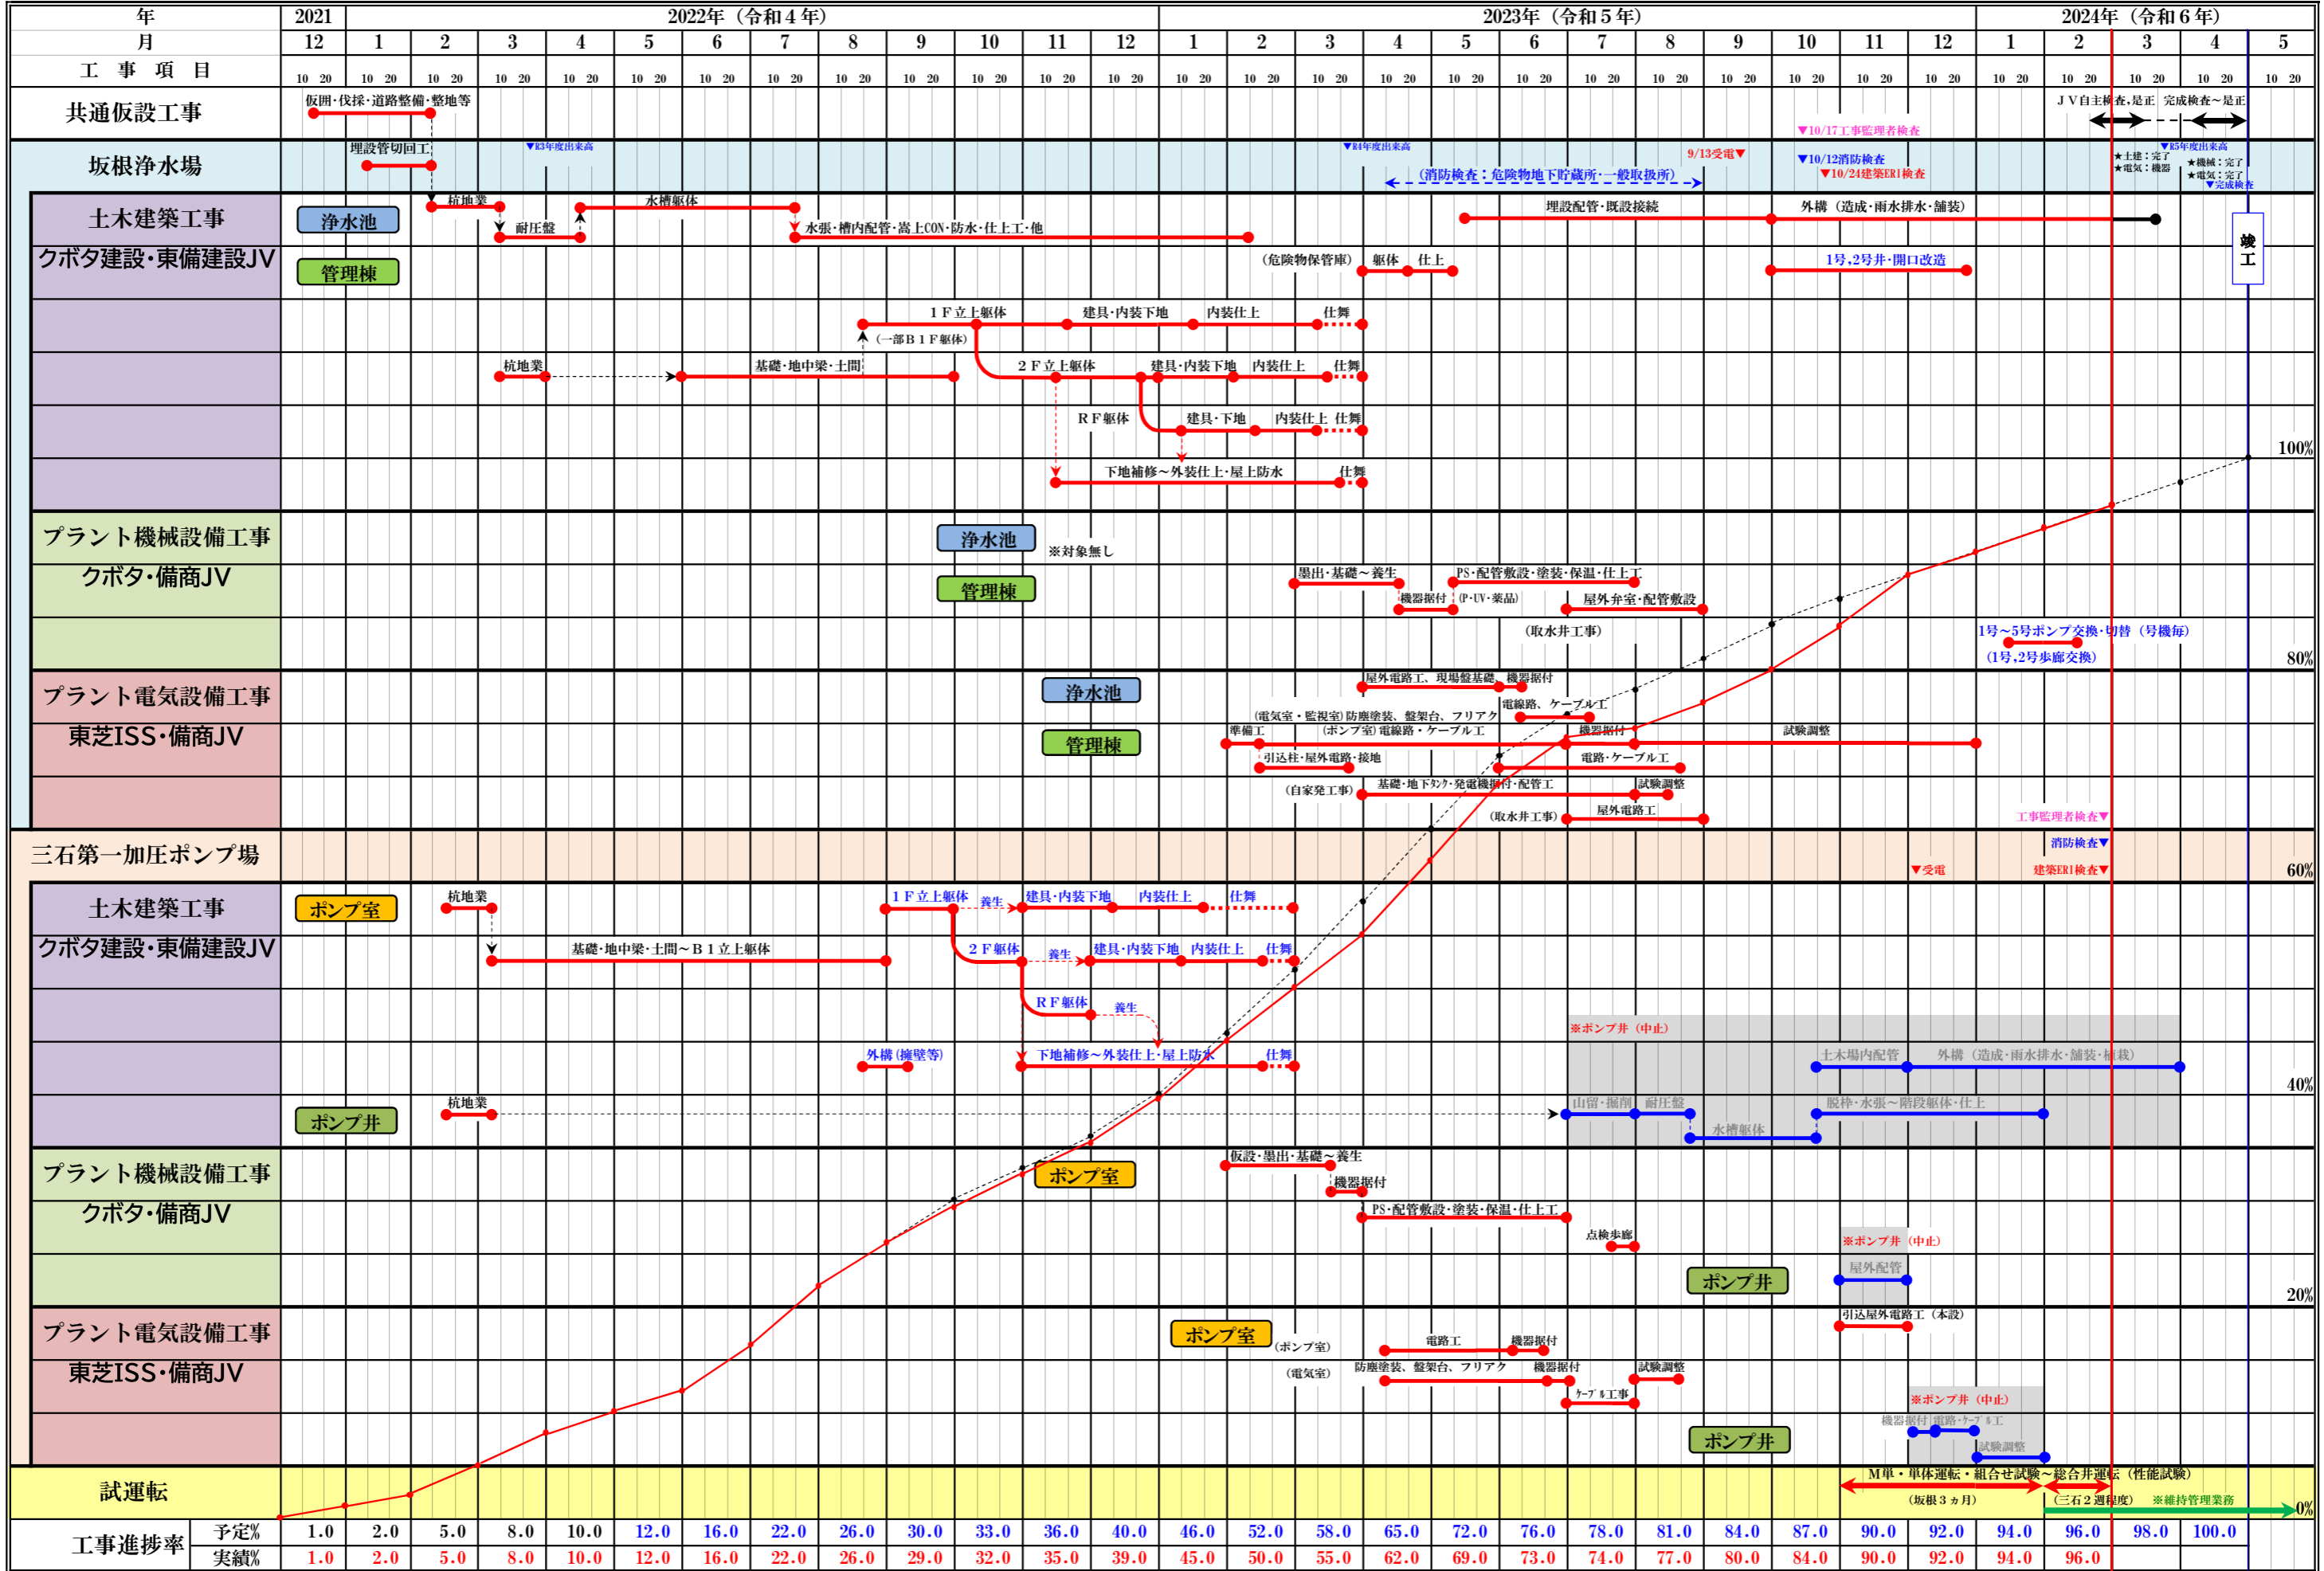

工事進捗率	予定%	1.0	2.0	5.0	8.0	10.0	12.0	16.0	22.0	26.0	30.0	33.0	36.0	40.0	46.0	52.0	58.0	65.0	72.0	76.0	78.0	81.0	84.0	87.0	90.0	92.0	94.0	96.0	98.0	100.0
	実績%	1.0	2.0	5.0	8.0	10.0	12.0	16.0	22.0	26.0	29.0	32.0	35.0	39.0	45.0	50.0	55.0	62.0	69.0	73.0	74.0	77.0	80.0	84.0	90.0	92.0	94.0	96.0		
